NYU Center for Comparative Functional Genomics
Master Schedule

Turner
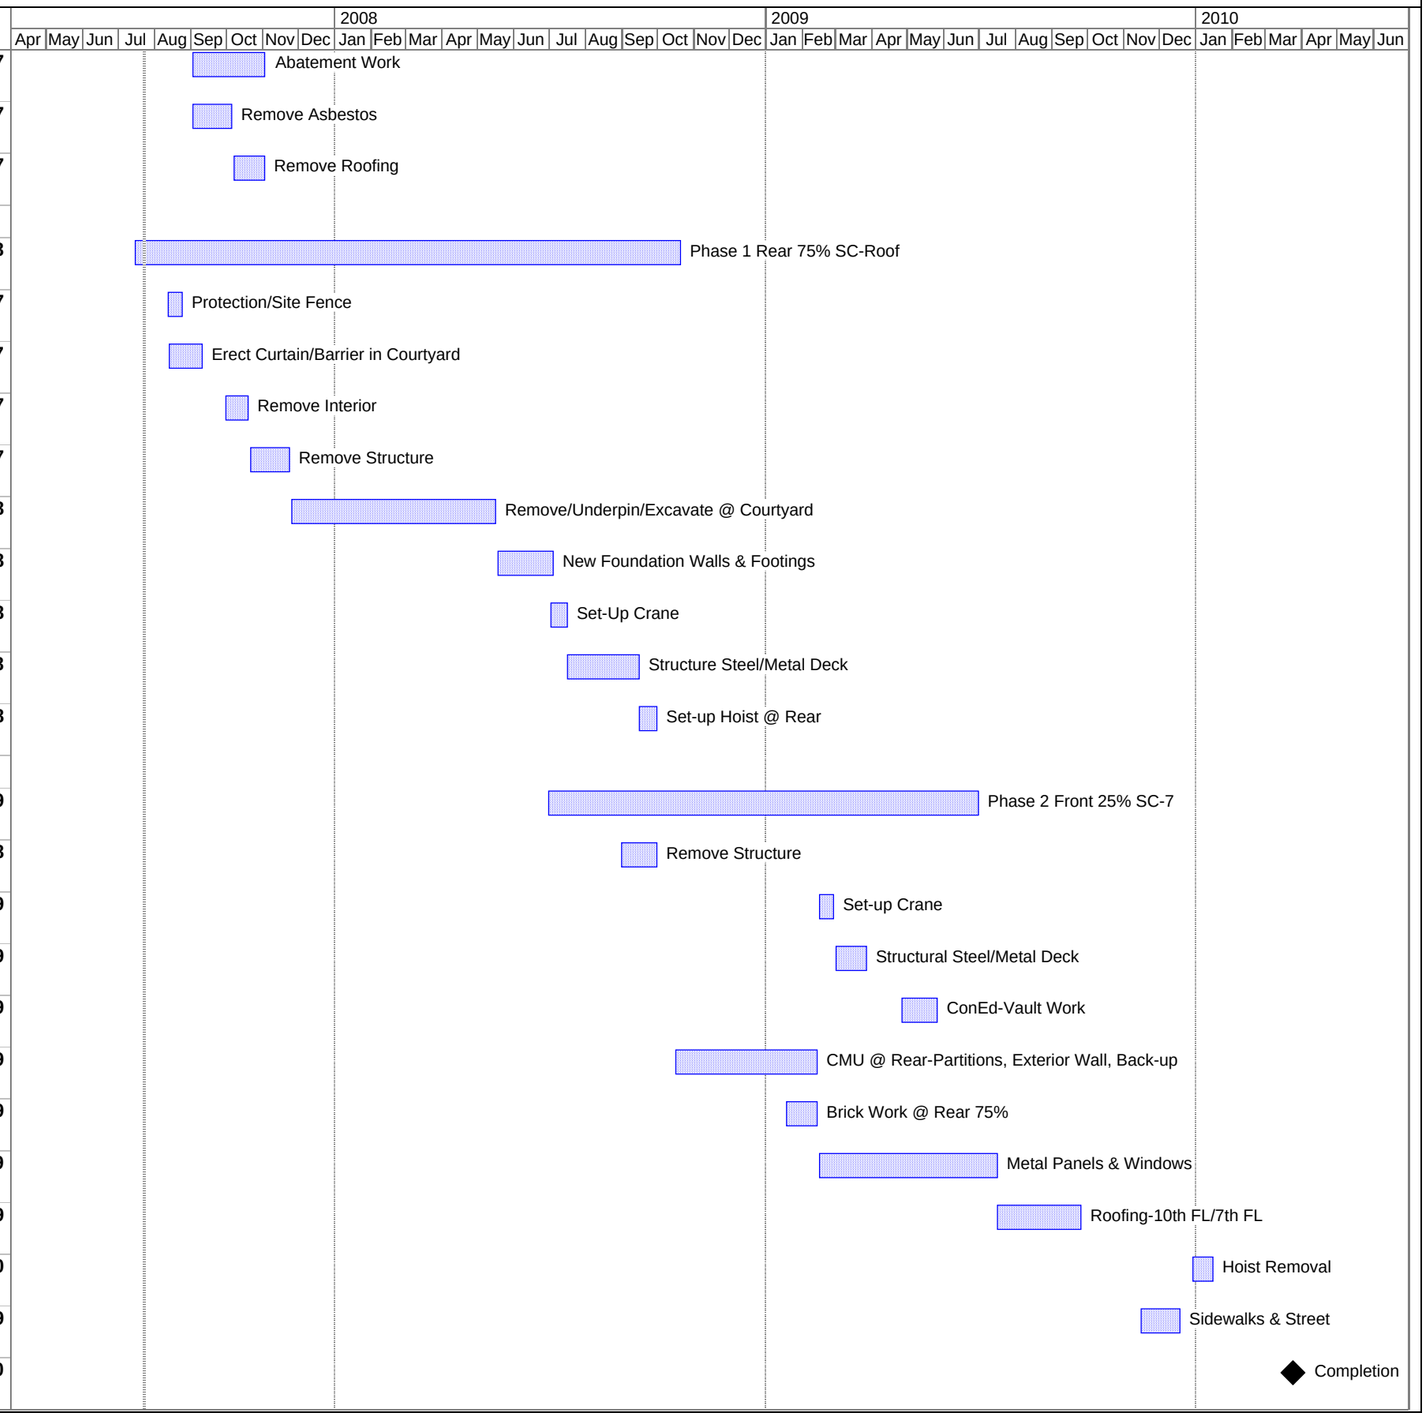
ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**Abatement Work**	**45 days**	**Mon 9/3/07**	**Fri 11/2/07**
2	**Remove Asbestos**	**25 days**	**Mon 9/3/07**	**Fri 10/5/07**
3	**Remove Roofing**	**20 days**	**Mon 10/8/07**	**Fri 11/2/07**
4				
5	**Phase 1 Rear 75% SC-Roof**	**331 days**	**Mon 7/16/07**	**Mon 10/20/08**
6	**Protection/Site Fence**	**10 days**	**Mon 8/13/07**	**Fri 8/24/07**
7	**Erect Curtain/Barrier in Courtyard**	**20 days**	**Tue 8/14/07**	**Mon 9/10/07**
8	**Remove Interior**	**15 days**	**Mon 10/1/07**	**Fri 10/19/07**
9	**Remove Structure**	**25 days**	**Mon 10/22/07**	**Fri 11/23/07**
10	**Remove/Underpin/Excavate @ Courtyard**	**125 days**	**Mon 11/26/07**	**Fri 5/16/08**
11	**New Foundation Walls & Footings**	**35 days**	**Mon 5/19/08**	**Fri 7/4/08**
12	**Set-Up Crane**	**10 days**	**Thu 7/3/08**	**Wed 7/16/08**
13	**Structure Steel/Metal Deck**	**43 days**	**Thu 7/17/08**	**Mon 9/15/08**
14	**Set-up Hoist @ Rear**	**11 days**	**Tue 9/16/08**	**Tue 9/30/08**
15				
16	**Phase 2 Front 25% SC-7**	**261 days**	**Tue 7/1/08**	**Tue 6/30/09**
17	**Remove Structure**	**22 days**	**Mon 9/1/08**	**Tue 9/30/08**
18	**Set-up Crane**	**10 days**	**Mon 2/16/09**	**Fri 2/27/09**
19	**Structural Steel/Metal Deck**	**20 days**	**Mon 3/2/09**	**Fri 3/27/09**
20	**ConEd-Vault Work**	**22 days**	**Mon 4/27/09**	**Tue 5/26/09**
21	**CMU @ Rear-Partitions, Exterior Wall, Back-up**	**86 days**	**Fri 10/17/08**	**Fri 2/13/09**
22	**Brick Work @ Rear 75%**	**20 days**	**Mon 1/19/09**	**Fri 2/13/09**
23	**Metal Panels & Windows**	**109 days**	**Mon 2/16/09**	**Thu 7/16/09**
24	**Roofing-10th FL/7th FL**	**51 days**	**Fri 7/17/09**	**Fri 9/25/09**
25	**Hoist Removal**	**13 days**	**Wed 12/30/09**	**Fri 1/15/10**
26	**Sidewalks & Street**	**25 days**	**Mon 11/16/09**	**Fri 12/18/09**
27	**Completion**	**0 days**	**Thu 3/25/10**	**Thu 3/25/10**
